ZData Statistics Service

Periodeutheving: 21

Planlagt varighet | Faktisk start | % fullført | Faktisk tid
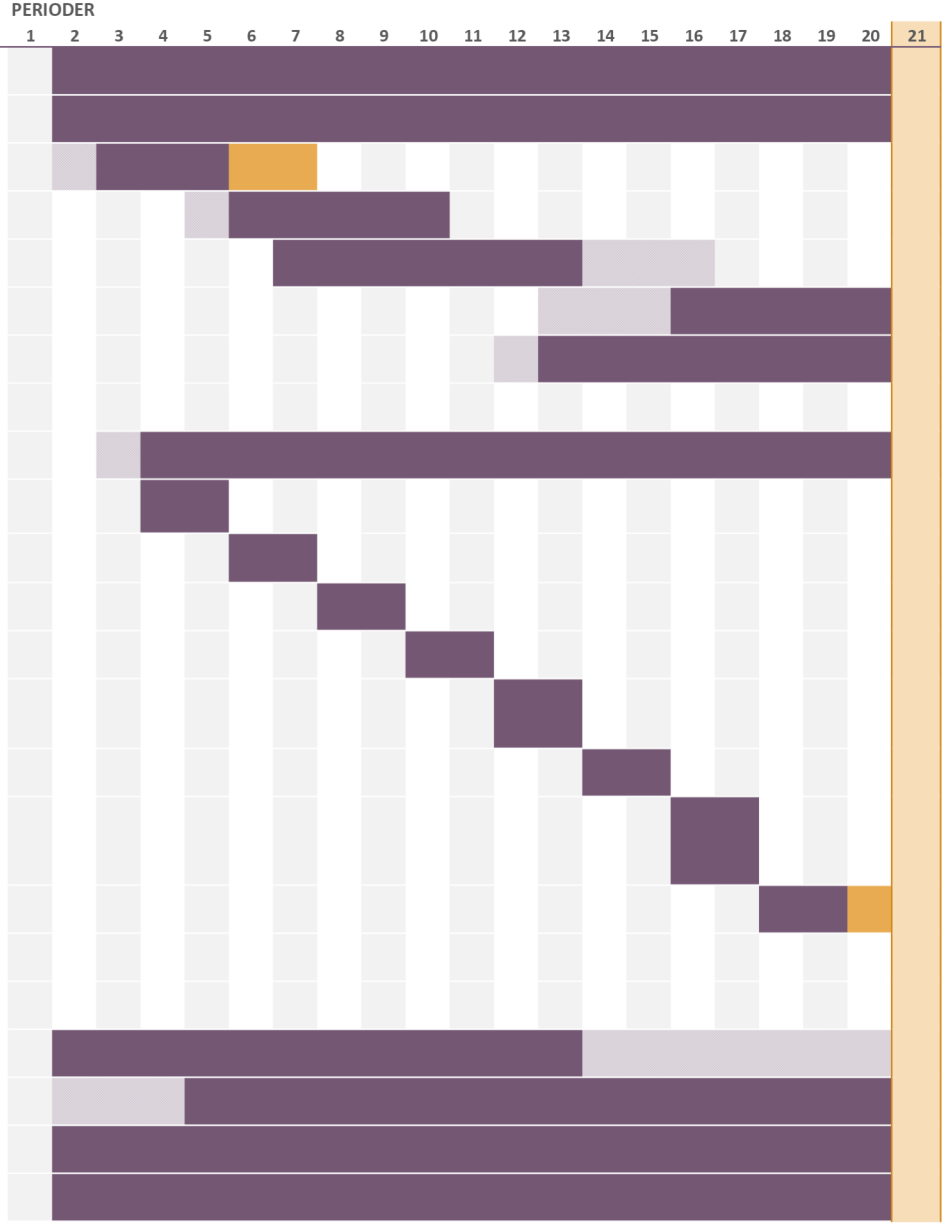
AKTIVITET	PLANLAGT START	PLANLAGT VARIGHET	FAKTISK START	FAKTISK VARIGHET	PROSENT FULLFØRT	ESTIMERTE TIMER TOTALT
Dokumentasjon	2	19	2	19	100 %	780
Prosjekthåndbok	2	19	2	19	100 %	48
Visjonsdokument	2	4	3	5	100 %	56
Forprosjektrapport	5	6	6	5	100 %	180
Kravdokument	7	10	7	7	100 %	56
Systemdokumentasjon	13	8	16	5	100 %	40
Hovedrapport	12	9	13	8	100 %	400
Utvikling	3	18	4	17	100 %	430
Sprint 1 (Mock/MVP)	4	2	4	2	100 %	20
Sprint 2 (Migrate mock)	6	2	6	2	100 %	30
Sprint 3 (Widgets)	8	2	8	2	100 %	80
Sprint 4 (Views)	10	2	10	2	100 %	60
Sprint 5 (Endepunkter, queries og logging)	12	2	12	2	100 %	80
Sprint 6 (Testing)	14	2	14	2	100 %	20
Sprint 7 (Testing, dokumentasjon og refaktorering)	16	2	16	2	100 %	80
Avsluttende fase	18	2	18	3	100 %	60
Diverse						244
DAT191	2	19	2	12	100 %	120
Forskningsarbeid	2	19	5	16	100 %	40
Administrativt arbeid	2	19	2	19	100 %	20
Møte	2	19	2	19	100 %	64
